INFORME A CITACIÓN PRIMER PERIODO DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP EPC

ING.RODRIGO HERRERA MUNAR
DIR.ALCANTARILLADO

20 DE ABRIL DE 2021

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

1. Estado de la implementación de la segunda etapa plan maestro de alcantarillado.

PARTIDO CONSERVADOR PARTIDO AICO.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA II

	CONVENIO EPC-CI-085-2017	CONTRATO CPS-100-2018
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los estudios y diseños plan maestro alcantarillado fase II, municipio de Cajicá.	Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado etapa II, municipio de Cajicá.
DURACIÓN	Doce (12) meses	Nueve (09) meses
VALOR	$324.984.704,00	$324,887,850.00
ESTADO ACTUAL	SUSPENDIDO	SUSPENDIDO



icontec ISO 9001 SC-CER253674

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA II
ACTIVIDADES REALIZADAS



Recopilación y análisis de información antecedentes y diagnóstico del estado actual de prestación del servicio de alcantarillado.



Revisión de catastro de redes existente.




Elaboración del estudio de alternativas.




Levantamientos topográficos georreferenciado.



Caracterización geológica, geomorfología, geotécnica y estudios de suelos.




Modelación hidráulica de los sistemas diseñados de alcantarillado



Elaboración de los diseños técnicos definitivos



Elaboración de análisis de precios unitarios, presupuesto de detalle, etc.




Preparación del volumen de especificaciones técnicas de construcción, manuales .

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

SUSPENSIÓN CONDICIONADA A LA GENERACIÓN DEL CONCEPTO CAR SOBRE PUNTO DE VERTIMIENTO DE AGUAS AL RIO BOGOTÁ SEGÚN DOCUMENTO EPC CUNDINAMARCA

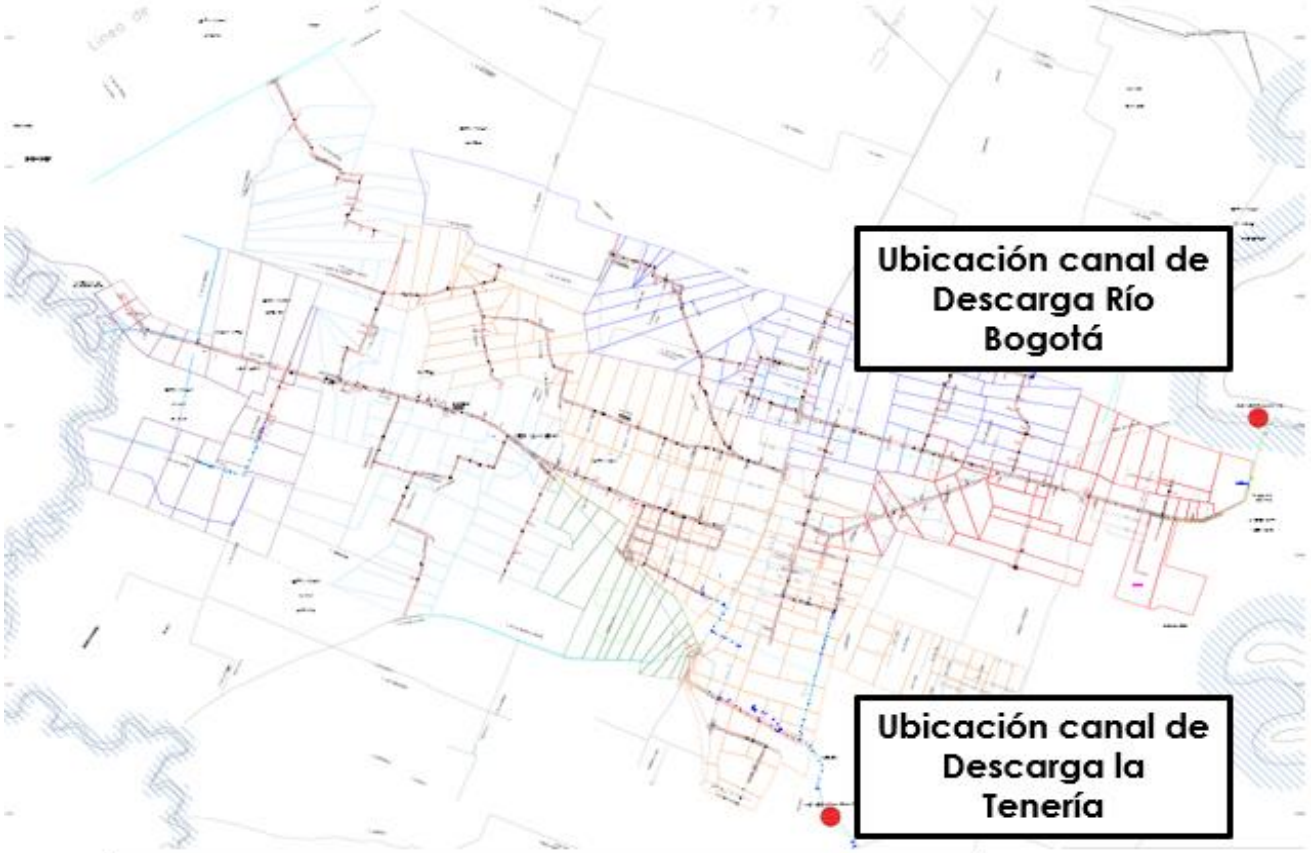

Pagos para **evaluación Ambiental** para **ocupación de cauce**

Despacho del Alcalde

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 3 5 8
(6 OCT 2020)

"POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA CONTINUAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 78545 EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"

Despacho del Alcalde

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 3 5 7
(6 OCT 2020)

"POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA CONTINUAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 78543 EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"

2. Presente informe detallado de la ejecución presupuestal hasta la fecha.

PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO CAMBIO RADICAL
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS
INVERSIONES EN ALCANTARILLADO		
EXPANSIÓN ALCANTARILLADO		
Convenios Interadministrativos Otras	$30,000,000.00	$0.00
Convenios Interadministrativos Alcaldía	$1,335,300,000.00	$1,312,833,333.00
Expansión de Redes de Alcantarillado	$197,904.56	$0.00
Adquisición de Terrenos y Servidumbres	$3,000,000.00	$0.00
Materiales Expansión alcantarillado	$170,000,000.00	$170,000,000.00
Transporte de Equipos Proyecto PTAR	$140,502,095.44	$139,502,096.00
Convenio Interadministrativo 004/2020 PSMV	$946,666,200.00	$888,791,221.00
Convenio Interadministrativo 012/2020 SAN JUAN DEL CAMINO	$833,135,941.00	$833,135,941.00
Convenio Interadministrativo 013/2020 PTAR RINCON SANTO	$618,796,073.00	$618,585,444.00
Convenio Interadministrativo 1374/2014 PTAR CALAHORRA	$17,523,261,276.00	$17,523,261,276.00
TOTAL EXPANSIÓN ALCANTARILLADO	**$21,600,859,490.00**	**$21,486,109,311.00**
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO		
Materiales Obras inversión	$80,000,000.00	$46,466,744.00
Levantamientos Topográficos en los diferentes sectores del municipio	$60,000,000.00	$0.00
Interventoría de obras de Alcantarillado	$140,000,000.00	$139,322,724.00
Reposición red de Alcantarillado Sector Calahorra	$352,000,000.00	$351,012,030.00
Reposición red de Alcantarillado Sector Centro, Calle 4-Guachancio	$241,000,000.00	$240,659,325.00
Reposición red de Alcantarillado Sector Centro, Calle 6-La Y	$233,000,000.00	$232,174,507.00
Reposición red de Alcantarillado Sector, Capellanía-Carrera 4	$483,000,000.00	$482,546,358.00
Reposición red de Alcantarillado Sector Santa Inés	$159,000,000.00	$158,462,645.00
Reposición red de Alcantarillado Sector ,Cra. 4Este Los Pitufos	$189,000,000.00	$188,739,914.00
Mantenimiento de Canales Abiertos –Tenería y Molino	$39,000,000.00	$38,845,000.00
TOTAL REPOSICIÓN ALCANTARILLADO	**$1,976,000,000.00**	**$1,878,229,247.00**
REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO		
Materiales almacén (aros rejillas tapas aros)	$150,000,000.00	$149,934,000.00
TOTAL REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO	$150,000,000.00	$149,934,000.00
TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO	$23,726,859,490.00	$23,514,272,558.00














icontec
ISO 9001
SC-CER253674

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

INVERSIÓNES REALIZADAS

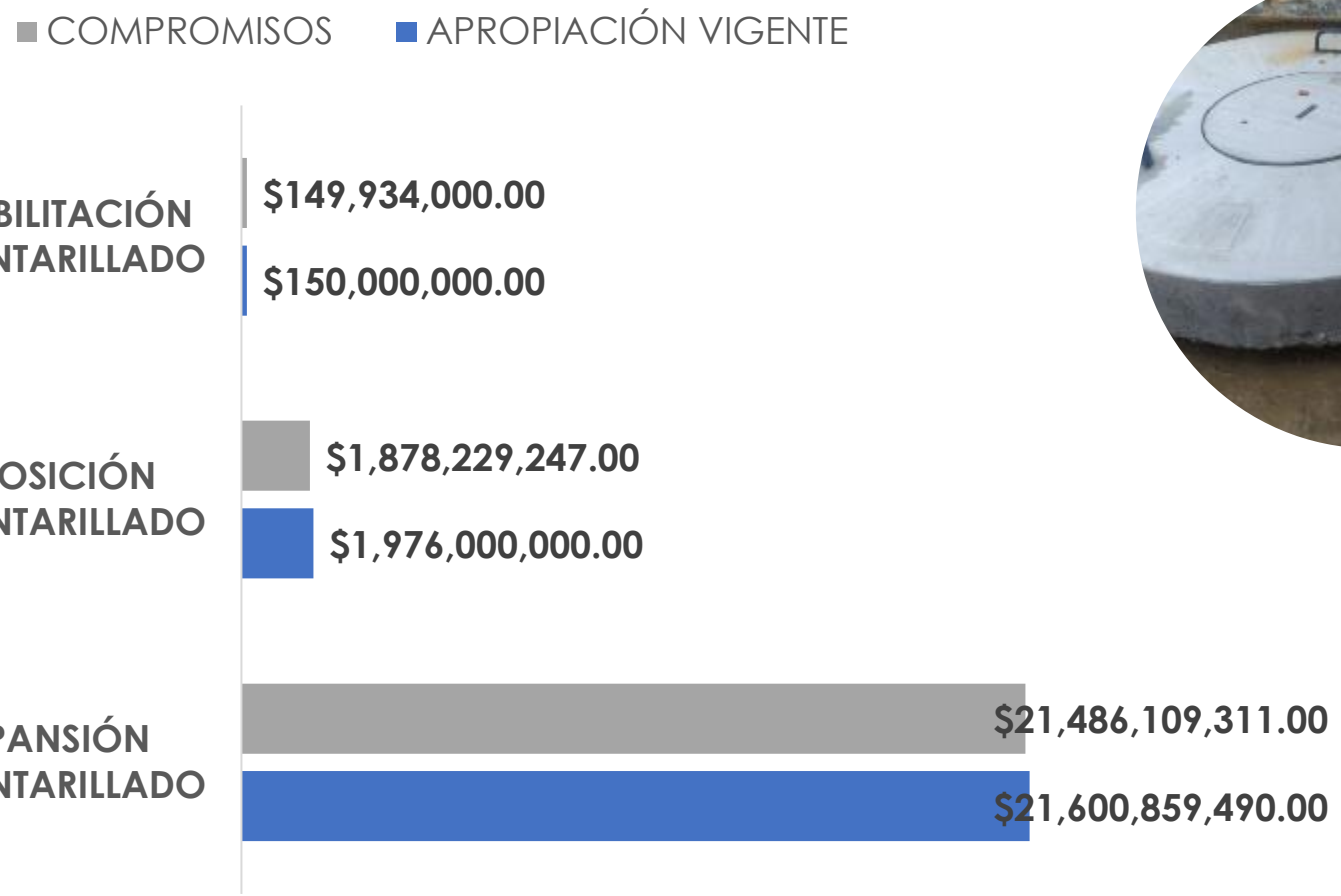







EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021

Concepto EPC	Proyectado 2021
Apoyo técnico - Dirección Alcantarillado	$28,428,000.00
Personal operativo *(Convenio PSMV)*	$91,464,000.00
Coordinador PSMV *(Convenio PSMV)*	$32,136,000.00
Profesional de proyectos	$43,260,000.00
	$195,288,000.00
Compra de asfalto en frío *(Alcantarillado)*	$20,000,000.00
Compra de material de cantera *(Alcantarillado)*	$100,000,000.00
Entibado	$80,000,000.00
Señalización Obras	$5,000,000.00
Herramientas operarios Alcantarillado	$10,000,000.00
	$215,000,000.00
Mantenimiento motobombas, rana, canguro	$25,000,000.00
Mantenimiento Preventivo VACTOR y equipos de sondeo	$50,000,000.00
	$75,000,000.00
Alquiler de Retroexcavadora	$120,000,000.00
Alquiler de Volqueta	$25,000,000.00
	$145,000,000.00
Estudios y Diseños Obras Alcantarillado	$150,000,000.00
PTAR FASE II *(Convenios Interadministrativos Otras Entidades)*	$100,000,000.00
PMA Redes Pluviales *(Convenios Interadministrativos Otras Entidades)*	$100,000,000.00
Catastro Alcantarillado *(Convenios Interadministrativos Alcaldía)*	$150,000,000.00
Redes Alcantarillado *(Convenios Interadministrativos Alcaldía)*	$100,000,000.00
Expansión de Redes de Alcantantarillado San Benito	$1,000,000.00
Expansión de Redes de Alcantantarillado El Gacho	$1,000,000.00
Expansión de Redes de Alcantantarillado El Bebedero	$1,000,000.00
Expansión de Redes de Alcantantarillado Quinta Guevara	$1,000,000.00
Interventoria Obras Alcantarillado	$1,000,000.00
Topografia de Alcantarillado	$15,000,000.00
	$620,000,000.00
Materiales almacen (aros, rejillas, sillas, tapas)	$50,000,000.00
Suministro de Materiales Prefabricados	$50,000,000.00
	$100,000,000.00







EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021

Proyectado 2021







TOTAL: $1,350,288,000.00

3. Dé a conocer la justificación a las demoras en el inicio de obra para la reposición del alcantarillado de la Calle 4, entre Carrera 3 y 5, teniendo en cuenta que estas tuvieron que haber iniciado el 1 de noviembre de 2020.

PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO CAMBIO RADICAL

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

Noviembre – 2020
Se identificó que el tramo tenía garantías vigentes con ASOCENTRO

Diciembre – 2020
Visita con Dirección de Gestión del Riesgo para identificar problemática sanitaria

Diciembre – 2020
Solicitud de la comunidad de llevar a cabo las obras después de la temporada de diciembre.

Enero – 2021
Solicitud de procesos para levantar garantías vigentes de ASOCENTRO

Enero – 2021
Suspensión del contrato de obra y de interventoría

Marzo – 2021
Respuesta de ASOCENTRO en donde informan proceso para levantar Garantías vigentes

Abril – 2021
Reinicio de contratos COC-004-2020 y CPS-118-2020

ASUNTO: Respuesta Radicado EPC 2559-2020 – EPC 2582-2020

Cordial saludo.

Deseándole éxitos en sus labores diarias, por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a la solicitud de autorización para intervención de redes de Alcantarillado – Emergencia sanitaria Sector Centro- Guachancio de fecha 04 de noviembre de 2020, esta Secretaria reviso la información solicitada a la dependencia de Archivo Central y se encontró que la vía a intervenir de la Calle 4 entre carreras 3 y 5, sector Guachancio cuenta con **Garantías Vigentes** a la fecha, las cuales obedecen al Contrato Interadministrativo No. 010 de 2017 con ASOCENTRO NIT: 800.177.622-3 en calidad de CONTRATISTA; por tanto no es posible autorizar la intervención de dicha vía hasta tanto se cumplan las garantías, sin embargo se debe realizar la consulta a otras dependencias o en su caso directamente al Contratista en caso de requerir un permiso especial.







La EPC mediante oficio EPC-0072-2021 fechado del 08 de enero 2021
Solicitó a **ASOCENTRO** la d**esafectación de las pólizas** correspondientes a este único tramo poniendo en conocimiento todos los argumentos.



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

Cajicá, 08 de enero de 2021

Señores:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO – ASOCENTRO
Atn. JOSE WILLIAMS BERNAL SARMIENTO
MARIA ANDREA PATIÑO
e-mail: secretaria@asocentro.gov.co
correspondencia@asocentro.gov.co
juridica@asocentro.gov.co
Dirección: Km 3 Vía Cajicá-Zipaquirá. Sector Manas, Cajicá.
Tel. (+57) 310 2082 206
Cajicá

Asunto: Garantías vigentes en Sector próximo a intervenir por emergencia sanitaria – Guachancio.

Reciba usted un cordial saludo,

Informamos que actualmente se están llevando a cabo las obras para la reposición y expansión de alcantarillado en algunos sectores del municipio de Cajicá, a continuación se informa sobre dichos contratos y sus respectivos objetos contractuales:

TIPO DE CONTRATO	No.	OBJETO
CONTRATO DE OBRA CIVIL	COC-004-2020	OBRAS DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN TUBERÍA PVC EN EL VEREDA CALAHORRA – SECTOR CAMINO DE SAN ANTONIO; EN EL SECTOR CAJICÁ CENTRO, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5; Y EN EL SECTOR CAJICÁ CENTRO, CALLE 6ª CON CARRERA 5ª HASTA LA YE.
CONTRATO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS	CPS-118-2020	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL, EN LOS SECTORES COMPRENDIDIOS EN: VEREDA CALAHORRA – SECTOR CAMINO DE SAN ANTONIO; CENTRO CAJICÁ SOBRE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 Y 3; CENTRO CAJICÁ – CALLE 6A CON CARRERA 5A; SECTOR CAPELLANÍA – CALLE 24 CON CARRERA 11; VEREDA CHUNTAME – SECTOR SANTA INÉS Y CENTRO CAJICÁ - CARRERA 4 ESTE - LOS PITUFOS.

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	PU Nicole Bedoy	Yelby Chavalier	
Revisó y aprobó	Director de Acueducto	Wilson Guarín	

Se recibe respuesta el día 16 de marzo de 2021 y el 7 de Abril de 2021 se reinició el contrato, a la fecha ya esta en ejecución.



Asocentro
Asociación de Municipios Sabana Centro

GD-020-2021

Cajicá, 16 de Marzo de 2021

Ingeniero:

RODRIGO HERRERA MUNAR
Director de Alcantarillado
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá

REFERENCIA: Respuesta comunicado EPC 701 - 2021.

Respetado ingeniero, reciba un cordial saludo de la Asociación De Municipios De Sabana Centro.

Deseándole éxitos y salud en sus actividades diarias, nos permitimos dar respuesta a su solicitud para la desafectación de pólizas expedidas para la ejecución del contrato interadministrativo 010 de 2017 por el cual se desarrollaron las obras de pavimentación de la calle 4 entre carreras 3 y 5 (Guanchancio) entre otras vías del Municipio, en este sentido la Asociación eleva consulta ante la aseguradora para realizar la acción solicitada por la EPC, teniendo la siguiente respuesta:

(...)
"Una vez estudiado lo solicitado por parte de jefatura del área, informamos lo siguiente:

Definición de acuerdo a las clausulados.

"ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL, DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN. ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE."

Se debe aclarar que estamos hablando de dos riesgos independientes, el primero el cual tiene cobertura bajo la póliza 1008643, en el amparo de estabilidad y se encuentra vigente

AMPAROS CONTRATADOS


No.	Amparo	Valor Asegurado	Acuerdo	Vig. Desde	Vig. Hasta
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	249,599,942.00	01	12/09/2017	02/05/2014
2	ESTABILIDAD DE LA OBRA	374,399,913.00	01	28/12/2017	29/12/2022
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	249,599,942.00	01	12/08/2017	01/01/2021

El segundo corresponde a una nueva intervención de un tramo de la vía como lo nombra el cliente y el cual debe tener sus garantías independientes.

De acuerdo a lo anterior y revisando el riesgo amparado por la compañía tiene vigencia hasta el 20/12 /2022, es preciso aclarar y tal como lo dice el clausulado el amparo corresponde "PERJUICIOS DERIVADOS DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SUFRIDO POR LA OBRA

www.asocentro.gov.co

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

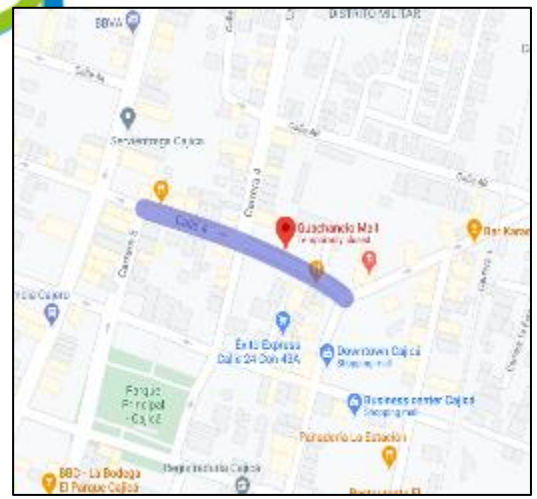









TIPO DE CONTRATO	No.	OBJETO
CONTRATO DE OBRA CIVIL	COC-004-2020	OBRAS DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN TUBERÍA PVC EN EL VEREDA CALAHORRA - SECTOR CAMINO DE SAN ANTONIO; EN EL SECTOR CAJICÁ CENTRO, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5; Y EN EL SECTOR CAJICÁ CENTRO, CALLE 6ª CON CARRERA 5ª HASTA LA YE.
CONTRATO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS	CPS-118-2020	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL, EN LOS SECTORES COMPRENDIDIOS EN: VEREDA CALAHORRA – SECTOR CAMINO DE SAN ANTONIO; CENTRO CAJICÁ SOBRE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 Y 3; CENTRO CAJICÁ – CALLE 6A CON CARRERA 5A; SECTOR CAPELLANÍA – CALLE 24 CON CARRERA 11; VEREDA CHUNTAME – SECTOR SANTA INÉS Y CENTRO CAJICÁ - CARRERA 4 ESTE - LOS PITUFOS.



icontec
ISO 9001
SC-CER253674

4. Presente informe de los avances del Plan Maestro de Alcantarillado.

PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO CAMBIO RADICAL
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

- Estipulación de Alternativas
- Instrumentos de Planeación y diseño específico.
- Pasos Estratégicos.
- Mejora continúa en la prestación de servicios públicos (Alcantarillado)



2014-2019

- **Etapa 1→ 35%**
  - ZONA URBANA - EJECUTADO
    - CENTRO
    - CAPELLANIA
- **ESTUDIOS Y DISEÑOS**
- **Etapa 2→ 35%**
  - **Fase 1 15%**
  - Fase 2 10%
  - Fase 3 10%
- **Etapa 3 → 30%**
  - FUTURO









icontec ISO 9001 SC-CER253674

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA I

CONTRATO	PDA-I-172.2014	COC-007-2014
OBJETO	Interventoría integral a los contratos de obra derivados de contratos interadministrativos o de procesos de selección que adelanta empresas publicas de Cundinamarca S.A ESP en su condición de gestor del plan departamental de aguas – PAP -PDA grupo 2 frente 1. Cajicá	Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá- Cundinamarca Etapa I
DURACIÓN		Doce (12) meses y veintitrés (23) días
VALOR	$413.778.960,00	$8.385.254.445,15
FECHA DE INICIO	12 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014
ESTADO ACTUAL	LIQUIDADO	LIQUIDADO

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CENTRO: Carrera 2 entre Calles 3 sur y Calle 1

Alcantarillado Pluvial: 542.7 mL
Ø = 14" – 16"

Alcantarillado Residual: 275.45 mL
Ø = 27"


CARRERA QUINTA
Carrera 5 entre Calles 3 sur y Calle 4

Alcantarillado Pluvial: 638.25 mL
Ø = 20" – 24"

Alcantarillado Residual: 854.9 mL
Ø = 20"

CARRERA SÉPTIMA
Carrera 7 entre Calles 1 sur A Calle 5

Alcantarillado Pluvial: 765.21 mL
Ø = 14", 18", 20"

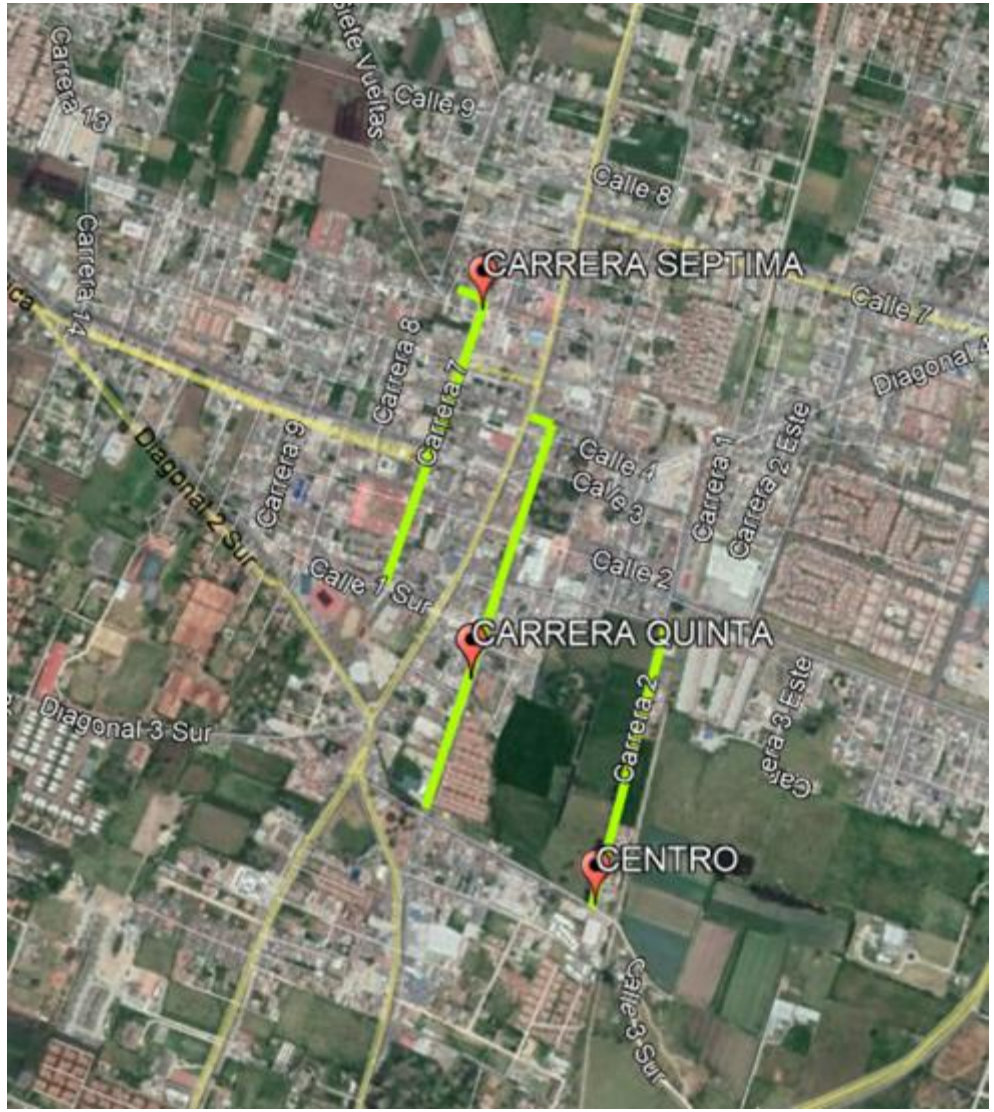

CALLE CUARTA
Calle 4 entre Carreras 7 y Carrera 12a

Alcantarillado Pluvial: 573.4 mL
Ø = 12", 16", 18" y 20"

Alcantarillado Residual: 89.0 mL
Ø = 10"


BARRIO CAPELLANIA
Carreras 6 y Carrera 6 (Barrio Capellanía)

Alcantarillado Pluvial: 832.90 mL
Ø = 12" – 20"

Alcantarillado Residual: 557.8 mL
Ø = 10"

CALLE 1 SUR
Entre Carrera 6ª y Carrera 7ª

Alcantarillado Pluvial: 93.5 mL
Ø = 20"

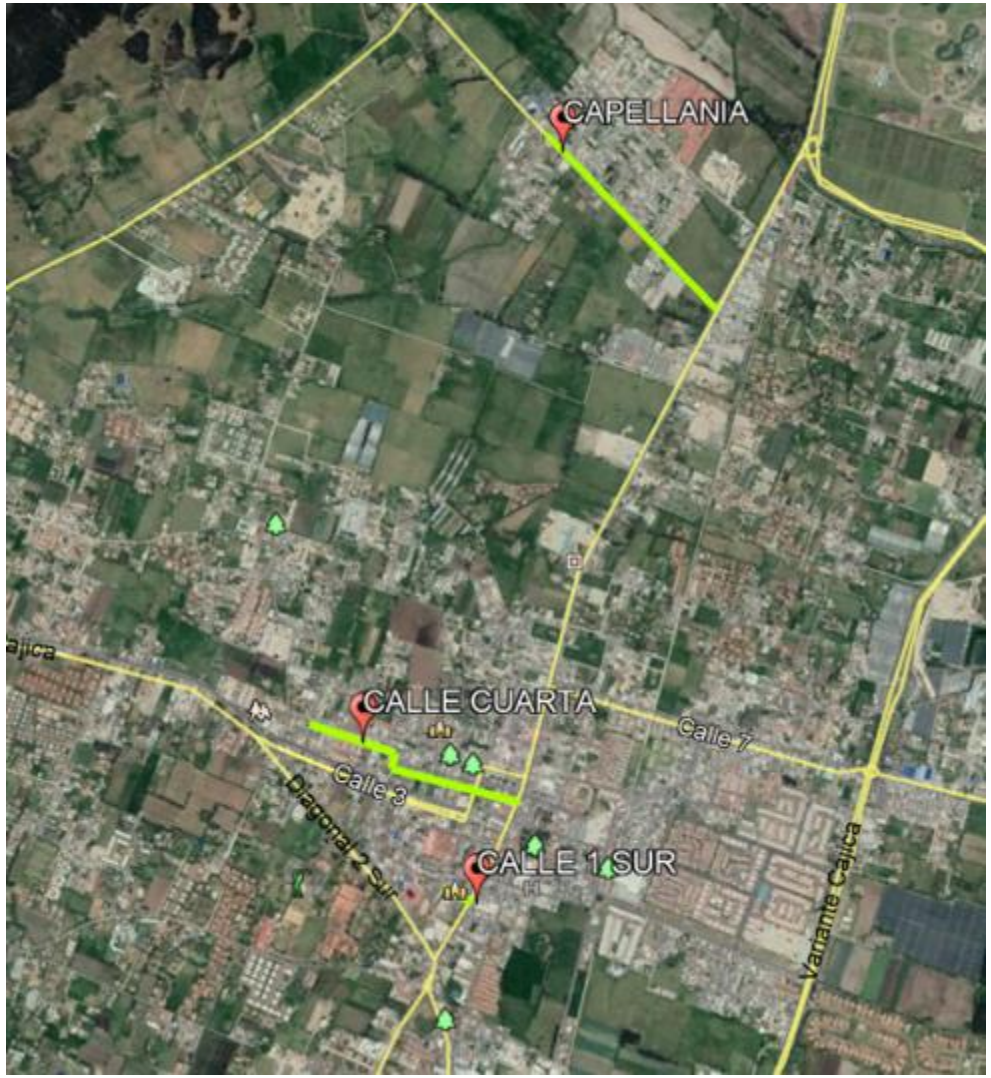

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

Servidumbre de Paso "ARA"
Entre Carrera 6ª y Carrera 5ª

Alcantarillado Pluvial: 85.0 mL
Ø = 20"

SIFÓN
Carrera 6

Alcantarillado Pluvial: 93.6 mL
Ø = 16"
Perforación metodología dirigida

Colector Final
Calle 3ª sur entre Carrera 2ª y
Variante Cajicá - Chía

Alcantarillado Sanitario: 560.00 mL
Ø = 48"



icontec
ISO 9001
SC-CER253874

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

5. Presente informe detallado de los contratos suscritos o convenios del último trimestre del 2020 hasta la fecha, indicando objeto, monto, mediante que modalidad fueron suscritos, link de la publicación en el SECOP de cada contrato y/o convenio, fecha de suscripción, fecha de liquidación (según sea el caso) y nombre del supervisor.

PARTIDO CAMBIO RADICAL.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	N°012-2020
Tipo Contrato	Convenio Interadministrativo
Objeto Contrato	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para desarrollar actividades de (reposición y expansión de la red de alcantarillado en tubería de PVC, en san juan del camino ubicado en la vereda canelón entre la vía cajicá – chía y la carrera 6 vía chía), en el municipio de cajicá.
Fecha de Suscripción	25/09/2020
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$2.033.135.941

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11156604&g-recaptcha-response=03AGdBq274dQrX7WGIdE1bNxDE_viwgPWQKk_-TFYQVk77CI1ZnT8S78yk8ZCjLETQ5c2T2NqzzobRiFtcvBz0Z2ZdUImZZdccWs3ka-M_fjPIN2V5gJpp04XHQDnTxbrZmiGDYupXZhKbGlHRFNbqH7kRLKT6JvdoRT7eZcuzf9ALY523oeHRMxxAzcMP33AKCsKmuM62mY6t6wuPc-7bjsffjrHhxt5m_mRuCTBEhjn-YagLE-p9v6Pss4e9geA7NFpEsYEBi3VAV-_5XMi7z2Lt2BaecRq1FT_1m4jQUwIxw_--s8yc1sLQdBJPMgraRS8RokZCuNIHXCBW9XWIMe0HMf-l70jHr_Niav7MQ89wwdTUxXi9gGNo-9K-NrBItfkwe43pkZtqy_Pq3rg4njWD71fYF5UPsQZyziNiy5exU94CUPzt0Yo_YEUUyA5sNULhuYcbBRZgBnXZnEJkdP974ucOTscwWA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	COC-005-2020
Tipo Contrato	Contrato Obras Civiles
Objeto Contrato	Reposición y expansión de la red de alcantarillado residual y red de alcantarillado pluvial, en el sector San Juan del Camino, vereda canelón, en desarrollo del Convenio Interadministrativo 012 de 2020 entre el municipio de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP.
Fecha de Suscripción	30/10/2020
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$1.875.053.485

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11275937&g-recaptcha-response=03AGdBq25udehAJIY6KSnR5n09BCvdtTDm_yTh0DkXI9TluXGZhOUtlzjuYG2wdRdIvfwPhknn3_XRa1uHSuOgp4GmmnaiLpyHCsAznI2NjhkH2WgAsVefmaWDYR_aVra_LpwiFR2d7vrfNy1Hdnn4kAaQNqhdwUD2oSm_2sQS60sq4CeeskFMnjscrfKx_7XFQiCgqrefpA5BvT2p2q3GfSbcjDt2nVAwvEiixRdouyb69KhuCkh6u1zXgUgl_JRLFF7sDeuR08hFOoXkZFJKy8QQTGLAtHhvBEh4z88-_njAo_gR-hMKCgaT2MwecIBldYg6iic0v116wYa40GmxxyE577yzoRmV6j1BbZitrlNQB1ODEXfpB5ayHJBpn0N32qvuYelsXdfT1oefO-vnBJkaKmDYIZWd7ZaCf3gKKxeG5fiEEnGRzurCEW6FTgES-TIFGbou9F7ByXffUsz2UmCXcrVehjDEHmyN62agqUiqfRwABUzF6hn7T23me1vPMEypnMuNO8W2iT8yny0qx3Q-tskGHHbHVw

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-140-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para el desarrollo de la obra civiles para la reposición y expansión de la red de alcantarillado residual y red de alcantarillado pluvial, en el sector San Juan Del Camino, Vereda Canelón, según Convenio Interadministrativo 012 de 2020 entre el municipio de Cajicá y la Empresa De Servicios Públicos De Cajicá S.A. ESP
Fecha de Suscripción	30/10/2020
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA


Valor del Contrato
$158.082.456

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11275335&g-recaptcha-response=03AGdBq25_p3tWcOSd2JD8HTUF60Xw2JtEOHuioMOfqXmT9Kr8ojDzECP197apJ8WF84_4nwJJn1gZhDUOZCzrjRXvCplfJPxtlqAqu7ya5lZbVt6aeO8vA32ehvlQ9gV5qrGtdrdZ0o3RBJJrw7_JXKT5maagkO0JI8aMxYGJoCM2tMiK5H10eSHvDNsJwzTL3H-NpB2TmaVx9I13Qad6r49QxGAf1MLSRkRDE8xYjM4jv0Vnn-n9ljiH86xKT2aKhvecB-Ffj8-8duHzzBdHnlTZtsKuWWAjzkVZUXPtOOQjUcQiqARGz8K2xLeP2fMx0FMmlzh3yLDkzS1_sffwtoBG_Cz0lO7oWrMkmPsGV9DzpNuyo95_E5gkWVMGGglfvkaEa9koXZcY_rtelUtJnYZjAgvRDCMldUVi5nbd_ZVVX9qkrlq2uV2PxRrPFvSB1bm1xM9HU12qZorMAM2ltkV1-TPpRnfldlvClPJbyfglqJUyDH1zXNDSnpujM47GCtMU7Zmg5GGFmNpFs5zjNaA2mcKxy7UZPQ

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	N°013-2020
Tipo Contrato	Convenio Interadministrativo
Objeto Contrato	Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el diseño y construcción de algunas obras complementarias para la instalación de la Planta De Tratamiento Rincón Santo según lo estipulado en el documento denominado registro de discusiones firmado entre el Instituto de Corea para el Avance de la Tecnología y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia en el proyecto de establecimiento de una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales en Cajicá, Colombia.
Fecha de Suscripción	29/09/2020
Fecha liquidación	En Ejecución

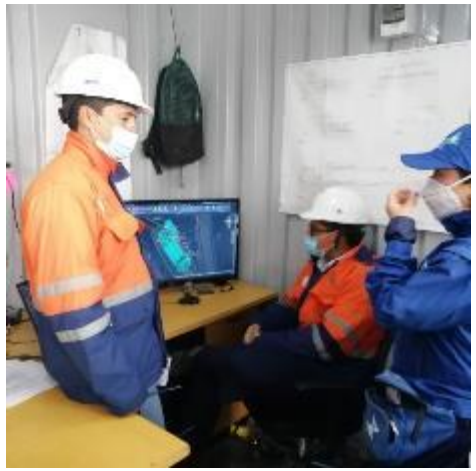



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$ 637,796,073

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11173362&g-recaptcha-response=03AGdBq26gHUi2DlHiQmcnFlnIYVto3FP0Tnn-iKHz-bUHHxL0Pn9Ldou0J2QNYvhvU5KJ1BJeu7jx6eys4BwyE89hUFOfgHCcNE2AAS-JbfsSfQqv5EgnwnOkWQVMmKF0-ffgFe5XaBH0VRWKCIfIC6wq7LouMI2REzMXp6jNyCELb9wFwKOdjKLGuheRkEMEaxqISmAfrjB6ivuli_hxPB4KEB2IkzSF19BJOd-Jll_h4ExdqAThqOlvxK2ZynT8RMFmJ4pYfpsrRLeZ67F-L0k9yCtU259vMpCO9-QIFoUcZDVfmqogvVpbrLtvQYhSwi8ep7BPM4QlGV1K7h8QSCSOw_mslzlmleCNXLXhbbxrnDXtNKp61sK41YpLgyty6Q-ZMJzCGLkVMJ8PikUJ70JTrfVAyf8N7QACGI1yw5_oQO4vPGatp54HEvo_oGAqUTyxk56RFC2FVSjfOtMMxmTDF7eHdaxyOcpc2s0wZDUg7qN7hBB8q5VjneHjS-Kk0TND7ugYxPTSxrGayvUimki6_R0npGMKN8_ag6Wi_P4ldUgua_2yvC8

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-156-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Consultoría para realizar los estudios, diseños de los carriles de aceleración y desaceleración, plan de manejo de tránsito, tramites ambientales ante la autoridad ambiental CAR e ICANH en marco del Convenio Interadministrativo No.013- 2020.
Fecha de Suscripción	30/12/2020
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$438.921.300

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11504164&g-recaptcha-response=03AGdBq24vPKEIZNK7bcNrQQ9ErQsxSArBJV9Ai1fH4CsqUHIgnXFYNJ_pPQ0_oaA1P7qJNlKhQpUVQrcJbiqOCIugzooaqSmHmsOsvqppPS483E3VhsITJhZZ0nn0H0HGJvFWA8HvMQLoFVRoO-TicyTQiUQAO81LXEgCmfkFjsV4q3OThlwJfSbabbbfuvnVqqrc3RfNMt1rTy0_0YHhI3ggkGLcCv7I5DTGqareV-rKWnDC1d9mD70OFb7eI3p1eV6gWLL63qcriosbE2yjP1wd1_nk83bowb6qBBxASHVSt_TrQOSypMFZr7bg1Sx4GOcKfhfZL5JA0qUYVYTtBlHa77nqoAI8NhoyxS7-VmlviLDAaSXx9Oqa9yEfuZBUwqMIv9VeWctz9ImVVsJL2p3pyfAayJVm9SBlC0PUD4M4hgh5WkpWVo-NgNAyhvxgy1odHZgjlrZ2u1ZDPOhgkvkf1p9Skg6vOurGk32LRo_obDoAD01cjwwGd6Oc5WWn7OgDqIky1X7zwOegZ9nC8ekbqB6uz_tdaA

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-157-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Servicio de vigilancia para la instalación de la Planta De Tratamiento Rincón Santo en el marco del Convenio Interadministrativo No.013- 2020.
Fecha de Suscripción	31/12/2020
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$88.679.788

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11529612&g-recaptcha-response=03AGdBq266xAP6Xu8sOrRYJvK5lpAPzlFx8wNxkorOQfjn7iZ15p4M9kfMcXR_ESC1SXnp3SdkDaQaLlSyAlQawSoY5dQVrxhVhU0KgV9OJPov8z0CT-sf2Ml0yENL5PhZaBLf3M97_HRFvmFyCU7eZym3nNnhQBeis6KPw7FBvOpuzM8nmMVMNs92NoNKo8_STEF6-ms4otTAcvSNeRdlSSW36MkOspnbvAJ9B_0Wuz05S33SWFSlIFPytDLUlq5Rc1s71nQ09z5H8jLr11E0TvCRlyXP8Ahs5XsL2iw5PjhrCF6sMqSDYRkwiHXle-br4aLKnyAxxgdedPIFzbnJHc7URnaUUcoDUNB4sOy0OdCMhh99QgM96UsoWfD42f5zUsk6bLNSoPNjksuD268qBTmOB4RkrFSkeuJdrpE3O5_izqkSiChZAfuENlJB_2ggWMfaEXvi2z_G3LoxrLuFJBXFHxJ_JvnWl0Os_mypTGNtOlwdxjnSvL4_3jB9KLcQ0ezgm1VqoxU4wuY6sZNYe3vLkllTRmL7Sg

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	COC-007-2020
Tipo Contrato	Contrato Obras Civiles
Objeto Contrato	Construcción de facilidades de obra para la instalación de la planta de tratamiento Rincón Santo en el marco del Convenio Interadministrativo No.013- 2020.
Fecha de Suscripción	30/12/2020
Fecha liquidación	En Ejecución

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$109.984.356

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11504012&g-recaptcha-response=03AGdBq24VaLuTw59T806aSt2NsOCrSaioyqQAvNEVqq106Gm89CuOKsRmbUQKZOoSAmLLhnuT7YN8e5DAZL87ZuzQDGIAaqmZgEUFKhweZMZiJU2XWQMYFUC-HYST9U1zX03dQv100zMQ3IJLxtr_MC6APr3Q7orhASSTLqd-tL42V8oVpOwWGq774dJWhVBhRnY7ka8k_Vy13gx1EjJttZcYfcryqAksxHmGXMouGcOOkuSRrQk5z9KI7ETJe8A03BMPBDTC9cF_6aOCjSgYI79MPSadP3irm-WWSmCQ9J6Hny0ogvOUwieZK3I2tpVqqD5xaRVCiKTOSK9pz-lUtTVURTL9JzQJxYcdE71I5gYOOzEvLAiaUKcCAzWc7Dn0tVkX5_orOr1wlDNiSeCnqz-BoqZwzMRkBjkn3IS4319iWAtHIchqIYZXhbT_PHe-jEexBgYJKrw4R_kEg9gBItbJ-ny2P_ECKChpaTo5-1zvycrpZ1T84CTVoRVF5iqh1pm0nzrllJmFxbqqP5J82LcZjmHFWSvzeg









INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	N°004 de 2020
Tipo Contrato	Convenio Interadministrativo
Objeto Contrato	Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá
Fecha de Suscripción	08/06/2021
Fecha liquidación	24/12/2020



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$1.017.966.200


LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10829732&g-recaptcha-response=03AGdBq25RYVvyr_KIZ7NMJIRd6FjnONsv9u8Jq8108U9SUfaVD5t4WL6Pebb9xrsqxfektexC8AM2nJkVVTFJbGJUXRbZx-6few-SEsV_e0sEvlyLrxoXkYjbGQ97NII6ADrJcln2rOlLfjLB8fcH81QlQ4hwNjZKiuAbMB5AYw9-kQjdrd07L9qkCyTf29U_Ac6bucmwdYwFudzOW8tcExDNFjc3MzaeMH4c6cWq53xLsSezk75j3lZs6ivOVWRzxy0tZQurVHpnnz2zOJEr-kMBm8yl4B5glwJyMQemGU3EblCmL2w1gD5qnOlg1KBVOMkVM0Kq5rqjVVHLF7cI8mjUtpOBpwchKhnqJa8s-QVL3P0QAxx0w7yGluVBFZBlEt11eumZq6GfOqzr0nUDSN4ayD56TYa3ZmGq9r5K0uyTTJbHNxQPnojmQsJdbEy9bPDWU1JG52o3BhOWIwyJpMO1rdwHq9kYdjFdSmrDA-LUZjWcniph3FfZRFWQHD8S_5MyAz0ofZMa6rtd4P7Or26gB9D5HTVotw

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No ContratoFe	CPS-119-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Contrato de servicios de rehabilitación y optimización de los equipos electromecánicos, de las plantas de tratamiento de agua residual de Calahorra y Rincón Santo, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2020, para la ejecución del Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos-PSMV
Fecha de Suscripción	1/10/2020
Fecha de liquidación	Proceso de Liquidación



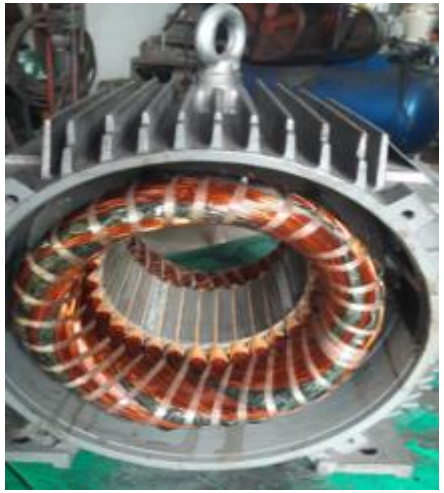

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$234.940.039

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11180719&g-recaptcha-response=03AGdBq24OM6P8Dmch4ZVB8QEG3Rgx6SLFWURYHh_gfLnJxLCOQwoajCVuTZ4CtYR1faqD8xVBaGKrOO26ZHe7rjXOC53NqbHPXbSsuDDrvM8RNPdZ9yCoseN07eiU0pOINH6TNmfyBNpr_VeE_-Vw6m_B0EO8ynbT-pSQdfliDA8-C9DP7aaiwbKqSsqW68FGrCzO-ZVqi_NbzjJICe2EVLaBsIxIuWjtAAffUlDbI9BFnmULnsKfIsmYpGmtmqB_2QjtakqwgJzoAjt9ttBGF9IpiW9itkilwtl37-QdB7D3t5eEeHpWU3sUCacO2gQ0qbPsIQ5vSa16KjJGisszKJZbK-cvA0ECqwaxS1rtI38_yOcnglKU17-K5KYVqi64LKn4zbK6r9ib52WpyLifqPFmchvXCZcW_xB0JW0ZYbHEPpKXO_NSAEc9E--v2ZcxmgOTNxOS22yTTHBDIasWzbpZeMFlXjb_LxGuCh2rWDypMPDMpz0pW_gafeyGzNF41zVNVHp-bEu8Y3WyD5BeVx5N8f1e0kvMGw

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-120-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Prestación de servicios para la elaboración de pieza digital y talleres encaminados a la sensibilización ambiental de la comunidad escolar en el municipio de Cajicá Cundinamarca.
Fecha de Suscripción	16/10/2020
Fecha de liquidación	Proceso de Liquidación



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$14.996.400

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11305734&g-recaptcha-response=03AGdBq25Wrwqx6skljtAPV66urruG9Yxm2gi1-nvglidEmVydKYxfE6o0iLfc16WUfCVIe01hkTpWx_zneqcSsBjT3kyKD9sD4_DFbK60BpdqrwX8LwQLosdKC4otgYQ7FUTY29Kqkj1QcXwPNh6kvka6LPL87osikbBQL8ej88FtSRivPzJUhIt3jN_Z6hV7zMRSF38eVFo3Ebt_WD5iHXWa6WpGFWY-Gw_gwKpspO2outG9A7BS4F3SEeva01uhRWW2Iq9FNSWIFsZ2FPgVucO2SIY68Lkk100VY7zo7U6yN0TWbAE4XG1OgvZi_6CIYjruRzS4yqxft0jqyQ8Jkhopy2yckF59CJzf4zZ75UYVw-BU1QWJSyQqcxATbbyq6cUVW2qlYF-mmYz2GlrZxyV_uGUOV-J920BXyMK-sYEtLw-KwQQV7-hzQZynOcqK1Kn-eXXYEBrdtQb2OZgR1QmnqCk4538DhTZTcNG_TxyY0VeraYoK9qtCkgtYr2aPiNcrxzlOdPY2MLyOZO2Pl2_E40v4yj9xwg

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-151-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Realizar actividades de disposición y aprovechamiento de lodos residuales generados en la Ptar Calahorra Y Ptar Rincón Santo contemplado en el Convenio 004 de 2020, para la ejecución del Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos-PSMV
Fecha de Suscripción	24/11/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$6.170.150

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11355972&g-recaptcha-response=03AGdBq27ONYwucf9PDTPYDb_e7oKyr53MEUdKm7RVoUbgGMbS2agrq9ruUGUSdivd-bkAz3OqTAz-4g1GU8cPpf0cCPJbShG6_Mbn3DptYLpGFBLSSiUqS6_VkBE0-p5y5-A6QoKMpJD1z3hOrFD57pLihkFkwIUAOE0FdQrBnbAjDdiI9Qt-tSeE1Cq_FrDU_ifkcAh5IqtvcvPlEuli6X2b6Eo24BrpnCq82gMaaUAcnHOLydmColeEuaoFKxp1C3egfr2nVSqvDCDmLoZmQkGMKadeWId-7a_cH-PyoJVhFulGAa9Jx0H1UpctAG1cMvhEwnP_y0qgEjxByf1BzFOO9XoZ32VHuWesJs7zGsoJbTXjodZWWvQ_Q1bPz4y6vqs6P_x2leuJfq3L7apatd3b9DwDiH7yuZfwVbdVM7eZ_JxX7p8mTynW5tuJete9N4KDAo7KO6VInJ8NUXP8FRByeQUhxBEs9OLonEtUi4tvNLMbt1Jey2Z58e134VknXjaFob14mNQltFXdqqD_guG9KkO6BGB7pA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CM-016-2020
Tipo Contrato	Contrato Mantenimiento
Objeto Contrato	Contrato de mantenimiento de la cerca viva en la Planta De Tratamiento De Agua Residual De Calahorra en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2020
Fecha de Suscripción	6/11/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$60.000.000

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11305734&g-recaptcha-response=03AGdBq25Wrwqx6skljtAPV66urruG9Yxm2gi1-nvglidEmVydKYxfE6o0iLfc16WUfCVIe01hkTpWx_zneqcSsBjT3kyKD9sD4_DFbK60BpdqrwX8LwQLosdKC4otgYQ7FUTY29Kqkj1QcXwPNh6kvka6LPL87osikbBQL8ej88FtSRivPzJUhIt3jN_Z6hV7zMRSF38eVFo3Ebt_WD5iHXWa6WpGFWY-Gw_gwKpspO2outG9A7BS4F3SEeva01uhRWW2Iq9FNSWIFsZ2FPgVucO2SIY68Lkk100VY7zo7U6yN0TWbAE4XG1OgvZi_6CIYjruRzS4yqxft0jqyQ8Jkhopy2yckF59CJzf4zZ75UYVw-BU1QWJSyQqcxATbbyq6cUVW2qlYF-mmYz2GlrZxyV_uGUOV-J920BXyMK-sYEtLw-KwQQV7-hzQZynOcqK1Kn-eXXYEBrdtQb2OZgR1QmnqCk4538DhTZTcNG_TxyY0VeraYoK9qtCkgtYr2aPiNcrxzlOdPY2MLyOZO2Pl2_E40v4yj9xwg

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CCV-016-2020
Tipo Contrato	Contrato de Compra Venta
Objeto Contrato	Compra de papelería, publicidad y equipos tecnológicos para el desarrollo de actividades pactadas en el Convenio Interadministrativo No. 004-2020 celebrado con la alcaldía de Cajicá
Fecha de Suscripción	21/10/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$55.999.788

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11241937&g-recaptcha-response=03AGdBq24R9SYeXByhDeGcOGL7gpG6iuZy5SyQikScNKVHlu-RIR1rsyer2lh6cjxfcSvBlNqwgcJTBkX2cYIOQEo7mpyBSWCmr8LS60Uapdfetr0qdBCIPC8TERxGKVbUjTHU7mqwRY70V_6MhXNgdCkSLJGFAhGlee4mvcvncAWjzuIMFqAp5F-kTLVDDvtudjsXFURYR2P3029-DRmTzr3rLUY6gzwEwasoxdmV4o79qrLRP3n4Sp75YZrpkEPBZrsIcvW8i31_BNgkMN56jmTYxo88ygIBJ9_rOjyP7JGb4aN-XIyC3KGIr3K9yBBGnSAow0hZ2UzamKWUdqsX3l-WvuT6WKUskp3dmEchLWEq6RCED_6x0HcdTGIONDw59cpYbtx6grToLAYecPK9Ke_pZkpH-dBTEyb_w9InxIh-_yiw2tGp9foeSPk1BtInZWUkyRNA1IzP5UlCyZlrXu0y7OrtmuGcpnX7PSIts-3xkEVRkEHj6R7fjnpB2PWsgu-bGIU5DDHKSA7YFGWPWZUaT5T6GQ5mhw

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CCV-020-2020
Tipo Contrato	Contrato de Compra Venta
Objeto Contrato	Adquisición de elementos de protección personal, dotaciones y elementos complementarios para actividades de alto impacto en el marco del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2020 celebrado con la alcaldía municipal de Cajicá.
Fecha de Suscripción	6/11/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$100.155.101

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11305805&g-recaptcha-response=03AGdBq26g_Y2su1N4BBCg9MIzTJr7kauxS1UHiG385pjFbIVw3pYEBLnXezfW1PYFyfMAKFawB2e_RE-8u7uu2zhO7ha-fr4HwqTa5szPEcFj316WIRFba5Z4lamSZShIH9zGFCfzQs2_x_skvXZtspFAth54ohdfRvI2NK26IYlipEPU5hD6zfITEsYx41WzxME_Wzx3MVskbDFe_SOpnQcxc0Lx1t6JItrjjeDOJyxmPOStMt3Bns54xYucpbk2g3aOnweqIn8fK00gQ1LBpbdmMYFt31uSh5I9qU5MrUtZYFh5s35JLfQ5zUHpJSP2Q8GAOr7HkGxt08fZW8sXIES4KCHHYXtsoUI-tyKTtgM4Iq1rg9mXGCoYdbHdjGqRpil-0iwmcM9_h2NWRrRVvzTPSl6wAY3-K5lbxmfIfOnREMTNFWawGM_36M12kvzpfF6RXOe7GgfE2olkzIQQJitIE9PCvpSaa4UAQ6WHxn0gH9gOHxHQn88A4WIAkuOU2ByJjrHsIBQ-uaCqLJp4dRDcghZpG5TNcg

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CCV-023-2020
Tipo Contrato	Contrato de Compra Venta
Objeto Contrato	Adquisición de recipientes y/o contenedores para la recolección de aceites vegetales usados en el municipio de Cajicá, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2020 PSMV celebrado con el municipio de Cajicá
Fecha de Suscripción	24/11/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación







EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$104.898.500

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11348545&g-recaptcha-response=03AGdBq25-rpWXMGAf1LZ88YSxaWES52pGG3WvUsMToMAgia4hqXvirDygon2rNMm3DfcIo5AMgU8G1CHtiRzf_gDa-oL-51qCaV2T2pJUqJmndP4ZdW047b07oNv7zxjHCwIO0ou2MePaOyaGK_1Ps4QrqjBxBOh3fFjSx9_5C1KZdfUftRpc76f6_hQkf4cknqE01IECKTCKy_I8c6vs3mnSV4HnyICqEa7O5pFb8T48fscPFFUEGQNIYcQgrP-Fj8N6fL1blp2rm2Z9pXkgTeY90Lc2wSncjWVxDRMFVwoPbhCRdb4R1Ct2CQcK5tD97vrfVFXpWjCfdSWdj8y7cl403sD7u6QwmCimg6mlbmWHd8lyV8JFgw372MO_VeAbc5zmI_8NwgOFPBuSXxlyO9Bbc21Bgwn80Wf-UU6gjyP7ZrfThO3mrrE9psAi0ccez3xYSFgPssMMTZ6FESuhsGnEc53J3xj44VcEemJH1-qvvpakR1mtV1TFC0xMxX50MGpOZAhML6HOKIo2-S5W6NZPl3Wrggtuxw

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CCV-024-2020
Tipo Contrato	Contrato de Compra Venta
Objeto Contrato	Adquisición de herramienta menor e insumos, para las Plantas De Tratamiento De Agua Residual municipal en el marco del Convenio Interadministrativo No. 004-2020 celebrado con la alcaldía de Cajicá.
Fecha de Suscripción	24/11/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$63.792.207

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11351495&g-recaptcha-response=03AGdBq26LoOa43UYQ4Nqyuzj4hM2f5dp2lp_rN96Bh35-qL7cbeqreCQ3lY43pQrUjzpuphPuuYRCnb80uFefFIVW_M55BC8vffePYzjyJOPnjWNrmRMUbqqomSReMOKAxU85-_ZDmtafhnJaO7Cl83aBJlQ2xkLD3lUgsaNlJNgTd0Bqn7_rtXSP8prHEZa7stB7q1t9VT4fwYl3zliuhkqLcNMx7npBJNlc_J8Qy3iScAia1ea5SLe6KuYsdl_x6y79ff_NiVVTnZbElvOxqjFlP2VD31uP-C8wrxFSkhHSXwlRwTTMvTLvoz9Kw6j7qOFHwqpji8SzN72rK8V87t8uiLW1Put1WuzCo-KOJgxX5JyRAnlShvLqtA-UHhPOk-EW7p4t981bDtCxMcc45e1Xa9J-HDEgcai_zQs_8ZFlZPgHXKPOp6nrCtwVAylQJUoFi9ru5-OfW3cYyfwZ1MoG04H_XqelLuHh5qt1vMVh-8fg0xp6fZt1e022mqNpUxwoCiZXaHf9K0OQ4oBg0FqO1eJCIBs_Tw

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	COC-003-2020
Tipo Contrato	Contrato Obras Civiles
Objeto Contrato	Obras de mejoramiento y rehabilitación de las estructuras físicas de la Planta De Tratamiento De Agua Residual (Ptar Calahorra), con el fin de garantizar el funcionamiento operativo de las unidades que la conforman.
Fecha de Suscripción	1/10/2020
Fecha de Liquidación	Proceso de Liquidación





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$89.975.991


LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11180857&g-recaptcha-response=03AGdBq25mWtJRqY0nJ95edfXaAKP_-zMnkPZ4oShH4BfJ35BK_NPpcOecio7payJSpwrXsav6deNHsU4beLO9Be3PyHHvWF2mgigq9albckjH-IMOCpvoHmxREIR4Guf9b-hTxGbc4sSwoi0Aw__Jea5VLeDYZ86ifmUiXfzY_6EJsB8yqCoV_TZKSnOCjFA9tUxnvHbTJjUyQ_II7X_4lYnhingfPLvpSs4DqaQuwTSFtRVVrjUdH6fuAYwvo1vxfCT67836n5ljTom1Elv9TwViHQZn9UcaGzeOAlSOBoveDq39EqLjYS3vU_DOb7lyUbTCFii2AZx5F-JSxsaTmwhBQe7ekUrKYczHoD3SxvCU-tHdCPcpyo7F9R4Vqtu_5jkDeRJNZveZHmgAwhOjWZooB35b-cJksroG63c1Ncc7jV28Yorq62f7HkY8FzDJZGxtoXy8CLqVWt5dg4Z4y9qdqys0Ri6Q_dUjOa24krm2NbzZtZJhuHqTiANQ01Lt0EohgXVHxPizhlx96zjfZspbA_tOR4xfqg

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-118-2020
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de las obras civiles para la reposición y expansión de la red de alcantarillado residual, en los sectores comprendidos en: vereda Calahorra-sector Camino de San Antonio; Centro de Cajicá sobre la Calle 4 entre Carreras 5 y 3; Centro Cajicá-Calle 6a con Carrera 5a; sector Capellanía- Calle 24 con Carrera 11; vereda Chuntame- sector Santa Inés y Centro Cajicá - Carrera 4 Este- Los Pitufos.
Fecha de Suscripción	1/10/2020
Fecha liquidación	En Ejecución



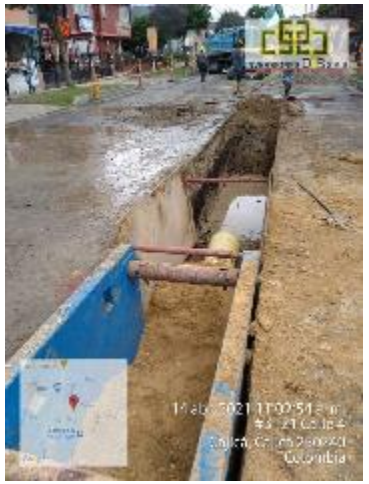

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$139.322.724

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11174764&g-recaptcha-response=03AGdBq27laCBTtTEvN1QMW6Ee5vplBJJ4ruMRHrE2YfZbtNlFDGdJPkg1OZIyFMfO9B1yOLGXz5vWZac89hD8EzZpv9QJK7uFLvRhA1a3ij7apfYcsOOKLmbcEJvXA2wAzrwTAreecrSFBKMVbV7WaTDUBT3uAlWvt_xAsTmalllajUOuRcpuoK-nWteX7HGTP_LOHGmuqOElJyWs8k_YETM2k6qk_jmKWbBIjCw7lAOfUzK-KWhpzUD6Ke0DitmAKj8M7IxtlPxcfCknBhTlsTTDptBuMttzvIJdkhzoiZt7waEulBgTl7zWFBvaR0Z9s8imvYKJCtDd8DXHppm6FT_nS1mns3BWXTJ95W1ED7aM_KlmU3aOPEMQFrW-vK05zORyTfLLEo9BAKNGeVFG_Xa2loFla3q4L2ut7WY17sa1CcbMTy9Q--VnqNKO_VPGILMCjB8fLouAjlersOugPRQ1coSSrT3yEp7kBKiEo1eFbkZhG5EukAtlkYazpuz0lqlhb4GsoAWYWpJrDaftwNp5OfWWY12eUA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CM-013-2020
Tipo Contrato	Contrato Mantenimiento
Objeto Contrato	Mantenimiento y limpieza canales de La Tenería, vía Manas-Molino y politécnico de la sabana, revestidos en concreto ciclópeo y en tierra.
Fecha de Suscripción	1/10/2020
Fecha liquidación	Proceso de liquidación



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$38.845.000

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11180674&g-recaptcha-response=03AGdBq27bRIxHzWKTwSkRD7Gk8qHKz_7V4RU5bDzGebAxaE9JRs3uhAi7CyEIINC7cSyKTNpVYpaMpbEu6I7Id7qFt0_2xozESKwtpyN4Agu2iHjnOymk4ILjSKHrwn5QSlohIRqhp2u_fRKgLrP5pGtQ_gO76fyX-hroW1Q7wNzyL18gw85gq1yKTIVLe31artM43zWghu7yT0KgkoSX0eXvgRyE4ChNMlcaHMj7hofu823wRcotVSWyXFL5f4pMiVVyS5L7U_hc3ISIGAZcxISUOMO8To4fTGVIiIfSOmNiB3vol91_g-_39Bs_LtsuWSj4hCFrPzkVwmkRcApkFysq8whiTRkCKbEWltEx8uE37tQJm_JnD7dckV0eHYJGX4wtKlyJqJ21Q8eU0MP58EfPIiM20vfbxiC1LAD1qcIhNc2xKrQtoY8IXrFKB2RRR_IcKcCo4yKZdGUsdmrn-wxk23wUvikYmOkBfuyG-n0vSFUEccR9WnkvOjYEkPboC_ih82XgHvU5RHAQ_hytVp01OaxuEPWDiQ

ISO 9001

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CCV-031-2020
Tipo Contrato	Contrato de Compra Venta
Objeto Contrato	Adquisición de dos (02) equipos para la medición de gases durante la realización de actividades operativas en espacios confinados.
Fecha de Suscripción	17/12/2020
Fecha liquidación	Proceso de liquidación





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$9.993.620

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11457318&g-recaptcha-response=03AGdBq247HH0nLqzbkjJZVDsig7cCFjicHnOCTP6ysVL6kCButoG6rgtex5vFriXPsgIchG0vVJgQAB1maE19LtydKrZO-PcAL7Vg6RXqUVavUmO0prtdrl07PwWNezIbHiry04dOxVn-QgtRhttgq4BGFcEjcITMNQjngUZpk5_PsQpATVtK3DcRoyPBIarC3blxrC1C66Esu_85HEmBwMrKARllGb24s2FO8sJLPT3vKnF9NklSnsQnAGZYcQtFhNrKiYCMmTU1250EW1UfO_YgmZb8iNEqFeFBacNMpNdHomOXHXwhfk-wqpfL24Apwtdfy-5gg3K9BZw7lehSem6wiOaFDvPsY9Thb5jOA4OiBdLh3Loqk4Xw-jrClJcj3R_hbtQvDV9KZvP61FCBe2m9UO2q_LMfi1doK-U4pM28l3pMjDfBpv1tngcUGGbSg0Op1mJnU_n6ceNcAXJaqw6GGLrRAak0Nt4LsxbBS270-mdrHSdR_rNU7x5rGBM6hbFQAhrv1iwWjBHRxkdu4jGKqDSXJjI2HA

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	COC-002-2020
Tipo Contrato	Contrato Obras Civiles
Objeto Contrato	Reposición y expansión de la red de alcantarillado residual en tubería PVC en el sector Capellanía; Cajicá Centro Carrera 4 Este y sector Santa Inés.
Fecha de Suscripción	1/10/2020
Fecha liquidación	Proceso de liquidación





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$829.748.917

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11175096&g-recaptcha-response=03AGdBq26arYcqottOHaPWOOf6aH4fFmslUJ-5nnP3eoKmSO5lava8Xeya6sPdhNbp7gyEZqxnEugES4MrPTgJBSm1_HhPzc9_DR9ilhzihBAscVhEpUZleaDn3elqZK6gKiShAGwsJmrjebpSjEac_zXRYsugFnfK9vmXx6kJI9H2xQCSC7vG4XDYG-K8vOYMAANBa-CEimNeXmX88lenSdl1bk0MTQwMCc2zTamkS4jiLaZqNz7kAQSEK_9wPUOgW91qgcfAUWAB4SOQfzBlKyPn8LHrU6tjdsw5N9h3dTx7Xv8u79lJy79d8-lK-t7_Vcu2FlTrq38khkjO-K8cdABtp0sJM6lmLAjAeeasx_nKwqpVtpNLwj9NFNR_rxBr2_4MsXlcXRq7RvnnTNiaEwC0lGl8XBZqi1tz-8K4lAQWLyjkzDYNUcuE7py7V5JD0l2TY6HSfiXBmaBwNVNFVGXXnNjwuQxhTBPTcXhD_6z0luDQVRzv_RXZxqvTfdkqhvYr2lHdT7nKbCGnvHMd8fAj2AsnPmnd-w

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	COC-004-2020
Tipo Contrato	Contrato Obras Civiles
Objeto Contrato	Obras de reposición y expansión de la red de alcantarillado residual en tubería PVC en la vereda Calahorra - sector Camino De San Antonio; en el sector Cajicá Centro, Calle 4 entre Carreras 3 y 5; y en el sector Cajicá Centro, Calle 6ª con Carrera 5ª hasta La Ye.
Fecha de Suscripción	9/10/2020
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$823.845.862

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11212788&g-recaptcha-response=03AGdBq270GJ-BL659sKoJxnsygO44CLeA2F4OyXXcTjx_hfH7DHmhVLwnjqXUPc6Wf4-4KFwrNGwzAYZhrFDPobzRMKJ3XXTw7WY2mGBj8KDm4i7Jzsk7avQy4Co0O_fQ5obD5zc9AuvbFYZZ2sObXF-_nu8yoiWjZLqIkE0_DzmTUk2tSzifyZbFY1St4xkOU0FBq-ylPd3fBiSccZoTZtAjo40Dmk1KGp0Ek3AV2NsBeBP92UxF3r6e8rv9Jz4xX3u-N5E-YBQNNqv7cm_0BUN5kHfW8gwxrBuPnuQbbwUXY4NvzTj81w7LJAzhi7t8v2vJaYtL93Fg_B-nL7eE1LZz_Qd2qghcwXLm5NZa4fhYO24G_gfo1shvsp4s8Q9R5dBQ-4RW5IdqcFUshhOp5-fm0UQpyBWW7iEaa0Z6X_p95pBUZ3boI-DARqS1XZN8paQAqnTqWaFlyA2x98FTsWq2bkOUj1dbjoheiKiNIJWZn2eU1cjCLobNm-Q9OoJnKyBOECwcWr9DOCxYP9FHIolaiLUPYropoQ

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	N°005 de 2021
Tipo Contrato	Convenio Interadministrativo
Objeto Contrato	Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá
Fecha de Suscripción	12/03/2021
Fecha de Liquidación	En Ejecución



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$394.648.100

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11788035&g-recaptcha-response=03AGdBq24xBcsLIz6JdW9lf1Q2dOf8HfGbdR-rhi2vFfO0xplOumwOePRlAICp-LCKBjE099RX0BBoGYWJsHbvAUJQqKJYtg1NarxtFmn9tIR9U-NA96xLqa6y1eNSYVXMGCr3urzCaya_dBEVNZhyXfyQqOd4vdzR3LKqAticZXOrYEpn9uvmEwlleEE0Hg7q2SWUggmWRU8-YAUl6t7nbp0zEVEk0_iMew96MPEUnvM3wkwgtYkjAnTsWHrghxMuUB95fOgMaQ_fVrQ4z4UadTNQgllOGQ3aMla8S0AOg_LmhmVFEcftJKGYpbvrvS1BwXKX4qwc4yeZBww-evRLsv3TElHzJsgJpf8ls6yuDygJPqVk8J__q9_9YDmFoPima5LjSawQ_Qxu8Baj-IDWT5bqHaUd4EZR5obgVMe7SSWMCSyPprvq8UP_fN74KfEGDzo8gc3CWtTu0U7yTFh_gc0M6ux7LrVkauXWpulGtYigdnsDpsSNXwySFr_nbUMi-UZhk3rmRbMyrgrAMyQk1Re6k2npq-I6Z6WkwtdvjWiE3nTlp2NW1Uk

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	N°006 de 2021
Tipo Contrato	Convenio Interadministrativo
Objeto Contrato	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para desarrollar actividades de reposición de la red de alcantarillado y manejo de aguas lluvias por escorrentía superficial, en la vereda Calahorra sobre la Calle 8 sur y la Carrera 4 - sector Camino de San Antonio y expansión de la red de alcantarillado pluvial, en la entrada de La Grúa, en el municipio de Cajicá.
Fecha de Suscripción	17/03/2021
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$ 445.616.528

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11810234&g-recaptcha-response=03AGdBq24YSMqexX7Kn0mKWlN3Zym4TBet5nDRP_M5Eob3Q3l_u5lE5fHeu8h_AL8Vph9kD5O0sJlxixRdY-2nBFGLAcHkumw8QNp_4hBgpExx-xlP2Rrsqa3N66Ufyjn34s5eElrlSAU1In2Fr7HkD4zf0MlqbOZ4UNVzLvtlTK3XFb-OjcDZHOtDYd2f0zoKsWe7JOGFwKuheVvSuBsk424ojMumFgQ0InbmD5PZ75ox0f8lGalxA8ptotG1McIaPsfBdXbRefM5kVpl7yQUnwF1VwfQYwar197DTkR8PyIhoWk_jC3ESd_mvXil-LrNyYBU1CuLv6tXCXKEvOwRkWlfeDtoIBbMjzhi_EDnq2fnDXtGJaFU8KunjxfE-LlMq1epgny1UWkd3vS_qbGLO4U3kxnvXfcI0A__JmkQ-XHL4zrav6pgdg2vb21KpAhMkEpxY3-rkOjoD5vaZKN4Az6VP00qunVNbw

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-008-2021
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Prestación de servicios para el mantenimiento y operación de las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar en el municipio de Cajicá.
Fecha de Suscripción	18/01/2021
Fecha de Liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$5.716.500

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11539811&g-recaptcha-response=03AGdBq267H5Gqla1ShR4UdviSFBE7fKXmaraMwDSbLGkHUkF7pfgFqJakkJkt3OIsDLwHqndUJpgxez9Wlw-df6WZwWPNf03euZYF5ZcmcAcb1LpcixgKQJRixNEwSyQvnvoKz6hNPqzmywKx6hKxCaZVt5fKLeYhd7kXgRi9vhIteDER3thVjNU4PBSAiUVvZB0bXDbrg0zLUiTRav4oYg3HvdCEfTY6s2tI8GUvlVDFFjvMNyt_7hWZ3ouNAC1VOVv9sHNE71gNa3fy4HBSswOm9Btn1xnDSzf1kAkQCkvUhFqQO112ocGJvI6Pdcx1EH1u0wo7mIvL807YgVqjaBmZMzxzmPO5eKgGdfE_T52tw_h10DleSwJSXJ6fDqVHSWSPZ8i7zp56PQCi1fvGSrumfstYY0WyLOaBZkjfn91RmsQtCYMoNqglNc8lcDDoQhALsb1WbSqrnsxRMu8lFtfhPmHeC2uyXMfSvD88QjDQQbA3U9Ox-I7hrFDi6oAjWuWVHEvwnqgw1KiYgYlWAnfMD2wzKTsr-A

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-009-2021
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Prestación de servicios para el mantenimiento y operación de las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar en el municipio de Cajicá.
Fecha de Suscripción	18/01/2021
Fecha de Liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$5.716.500

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11539806&g-recaptcha-response=03AGdBq24stgjWemqhVQHLkioHnwPkJzznqWaS73dcByhVLdgbr7j0hSBxZKmeXtD54k2B-zf09mrScfwP8lYQ7_g7qzWL8RimUVYWQ3n7CL1RX-gOzlJ5PO1KPXvfdF6tVQLQP4uAeNwOu_WV2OcU8_YWPLfinNK_G8woTbf95rYpEKJSpbybaBDCh4cYPc1jEt2OXcNEu08a5QTXguXfJHlCAlLlPb1vQ9eTkHKEUxdo70doR7SbLbz_h7ZGZWvYCQ3joyRGVC3fhuDsltzAlkAyrlYKCsfdhOwax0L2abKI2lMJxzC2jX3KmFl3gqRlnTuzL0h_oV1glVVMCRuYYVDqrrFaBmfQHU5cfU0sRk5OWknNcOvHzNwkX-xp4r0C81DSZBvx9CLUWhaVjNVb8k5z90kmOloJfhtLNx0yEBXH6XpChD7ksDORoD2eNLlHnjBo2GOThCRVhTZiTzYb6HcQpFhrHb4m_FBbz1jAjJlvNtvJj8K2oFl9ClywlDYHLj1_9oJe97HChtmZ-8ymdkSzkVL9BYNxfQ

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-012-2021
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Prestación de servicios para la coordinación PSMV, para la ejecución de actividades contempladas en el documento PSMV.
Fecha de Suscripción	18/01/2021
Fecha de Liquidación	En Ejecución



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$7.899.600

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11549082&g-recaptcha-response=03AGdBq25hs3LllaO-erQKCU1t2WqWQ6ZAXCcilcKvi8lMmsBzJuU7uZSrlhpu5m4oUVdztFFQLYodMWUJgrtWSddXomSFU2Zn6SgDXUG9nYUuiV5V4zkYe4GB0GpoQrP72LCJ08JE5gUFdilTDiN0HN7z8el8vcDl8ayoARp8vZrlaoloGwGkT5wq4sAUDSu43BjBewFtAhq-C8UrvW3KuGjrYjZihGC2_urjCBkWwWRNlen1Jpb7mx5_lo1LKhvbkadz7BvoqCDTE5tzNFyKEDxeS3iq8lNrWkaTfiDol5FzrxbJ862jnVFXPEnr-jrRzEl_qSumK06WoWJBQAmfXEqfPgBxFvKby7QVAnnYGHh9qV8ee7ObYVMbil76iR7l8WrgK1NTX0PDqzJEJDqa3MDdvGd3KFzzRrVkcslugHpRfEa6NXJ9PNhvD4JJ7W_QCRhz09DVeJNP5DCUbTKv1cvtrOU4gxigdWrCFal2oT8DC0KMEci9lrCIPe7mwfUXeVGwjsqyB0vPb-TyXND8Km7bYZvleHXgEw

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-013-2021
Tipo Contrato	Contrato Prestación de Servicios
Objeto Contrato	Prestación de servicio asesoría técnica para el apoyo profesional para el área técnica de alcantarillado.
Fecha de Suscripción	18/01/2021
Fecha liquidación	En Ejecución



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$26.347.000

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11553073&g-recaptcha-response=03AGdBq262rF7gRffSG9oVGfuCGzaCfeTmusF0AZrICM7KPStPn6707NUmY73xtboW0tL_-4YfXNWuPisKDMLDgvOicLMZHewUv94jpNF6iMCm71V_6TW0fQ41DEQ4cN9V3GoSgQwjziROcoH93FFICVce0dD5pfitBj0336NHIw-E0guX4SS-6V7UAd86XS6m6EU2mbpwg1gS2kjsk2ZJQJeEvO11bZyZ70hqGxuQL874P7bKJ_U6DrQnQzPIFj-tbgVjCdi0jmf_TmBQV0Ey7jVYg0C-hdMzcUBd9RC7QL9O0BWTC0FJRJSxkHFRdq95CPXdcK7MSZe6yQeDuFS40Z9nmnons1IGt2wZl47pDOJldjPCG1oCVvNbnizo-Ad4KWY6CGJHAwcPZr56finTgvzdLE3AW7e8JnSr7H86B3lj28spaglrCbDGZT3xGJ3NXHwE1iS9dYfjjyMCaplFxKLZa0H9AvNxiSBLqy3Qt0U1OqKiRyu2ZWOkpom6O9Wm-H1pQyzcktD1QF2vY5Z0BXLP_fwXeblZHA

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	CPS-036-2021
Tipo Contrato	Contrato de prestación de servicios
Objeto Contrato	Contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría técnica en la estructuración, ejecución, y gestión de proyectos a cargo de la dirección de alcantarillado y en particular de la construcción de las Ptar Calahorra Y Rincón Santo.
Fecha de Suscripción	1/02/2021
Fecha liquidación	En Ejecución





EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato
$43.260.000

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11610036&g-recaptcha-response=03AGdBq253Y8nIloZ8SDKTT5sH5ELaBAkmmncYVl63633Xu_aHoNNS_On05tLQsyzWt5v7Pt8gz6Js2i44RrnxndktJIGX2OQkIEh9RTwmoXPs5kc8e3hUNXEyknEf1rl45340_oX_9pNWSgQ2gOqg47zTSdusJdG5du2nO47cD5l4L8sYHlpBnqYmSObCHJGsGQEb-x48HUU1E6vrBssAyhV5cz5-NVwrMDNp-7hskxs8oQmwV02yl8A2Co5xroFcz7U9s7yxXk7nrKMmy1-gaPUlPgZMtD0vqCeCuo1NDFeP070XAASCM6cKLDWFa9Kq0rgEpENtoDiOK3xOQ_a4TnSUp8TRI8ZfG4TpqCOaWx1ZG9Q4Xt_L6yijR-eWl1m2KYjdYV6je8cq6zjKeTVAyRvQIlMitKOucwTPKoLv_aEKjNxnf1k2lkhgzld5VRQIXUfJG5k_t4OK_QsjlPn7sA-FNiQJXi6qjVPKth4G3OYg7hDi-21N_isk8qgSaQjS92oYh2_bwZHsStZb2OHFuoOVimYAPc3GJQ

Gracias







